Escuela Superior de Ingeniería

Documentación de gestión del proyecto

Aplicación móvil de información sísmica del ROA

Grupo G5 / PINF

Versión 0.1 — 11/11/2026

Documento elaborado por el equipo de Análisis.

Índice

Control de versiones del documento **2**

1. Identificación del proyecto **2**

1.1. Datos generales 2

1.2. Descripción y objetivo 2

1.3. Alcance 3

2. Integrantes y distribución de roles **3**

2.1. Estructura del equipo 3

2.2. Listado de integrantes 3

3. Planificación temporal **4**

3.1. Hitos y entregas del proyecto 4

3.2. Diagrama de Gantt 5

4. Asignación de responsabilidades **6**

4.1. Responsabilidades por rol 6

4.2. Reparto de tareas por semana 6

5. Seguimiento del proyecto **8**

5.1. Registro de hitos 8

5.2. Seguimiento periódico 8

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Autores	Cambios
0.1	11/11/2026	Hugo Freire del Río, Adrián Bernal Moreno	Primera redacción: identificación, roles, planificación, responsabilidades y seguimiento.

1. Identificación del proyecto

1.1. Datos generales

Nombre del proyecto	Aplicación móvil de información sísmica del ROA
Nombre corto de la aplicación	Pendiente de acordar con el cliente
Cliente	Real Observatorio de la Armada, Sección de Geofísica (San Fernando, Cádiz)
Contacto del cliente	David Rodríguez Collantes, Teniente de Navío
Equipo de desarrollo	Grupo G5, 13 integrantes
Jefe de proyecto	Francisco Javier Sánchez González
Repositorio del equipo	https://github.com/jaimediez9/Proyecto-PINF-Deteccion-Alerta-Sismica/tree/master
Fecha del pliego de requisitos	30 de octubre de 2026
Fecha de inicio del proyecto	23 de septiembre de 2026
Fecha de entrega final	Pendiente de acordar con el cliente

1.2. Descripción y objetivo

El Real Observatorio de la Armada (ROA) mantiene una red de estaciones sísmicas en el sur de la península, el golfo de Cádiz, el Estrecho y el norte de África, pero la información de sus terremotos apenas llega al público. El proyecto consiste en desarrollar una aplicación móvil que muestre los terremotos registrados por el ROA y **avise al usuario cuando se publique uno nuevo**, incluso con la aplicación cerrada.

La aplicación toma como referencia la app de terremotos del Instituto Geográfico Nacional para Android, pero con los datos, la zona y la imagen corporativa del ROA.

1.3. Alcance

La aplicación informa de terremotos que *ya han ocurrido*: no es un sistema de alerta temprana y ningún texto, icono o aviso puede sugerir lo contrario. El cliente prefiere *una aplicación sencilla que funcione bien a una muy completa que falle*, por lo que clasifica los requisitos en imprescindibles, importantes y deseables. El detalle de los requisitos y de su prioridad se recoge en la documentación de requisitos y análisis.

2. Integrantes y distribución de roles

2.1. Estructura del equipo

El equipo está formado por 13 personas repartidas en cinco roles.

Rol	**N.º**	**Funciones generales**
Jefe de proyecto	1	Coordina al equipo, reparte tareas y actúa como enlace con el cliente.
Analistas	2	Análisis de requisitos, modelado (diagramas de clases y casos de uso), consultas al cliente, planificación y documentación.
Diseñadores	3	Elaboración de maquetas de interfaz y diseño de clases y de la base de datos.
Programadores	5	Desarrollo de la aplicación. Organizados en dos grupos: A (*frontend*) y B (*backend*).
Testers	2	Revisión del trabajo de analistas y diseñadores, ejecución de pruebas del software y notificación de errores.
Total	**13**	

2.2. Listado de integrantes


Nombre	**Rol**	**Contacto**
Francisco Javier Sánchez	Jefe de proyecto	javier.sangon@alum.uca.es
Hugo Freire del Río	Analista	hugo.freiredelrio@alum.uca.es
Adrián Bernal Moreno	Analista	adri.bermore@alum.uca.es
Eduardo Carrasco Ahumada	Diseñador	edu.carrascoahumada@alum.uca.es
Daniel Rodríguez Sánchez	Diseñador	da.rodrisan@alum.uca.es
Emilio Díaz Carmona	Diseñador	emilio.diazcarmona@alum.uca.es
Jaime Díez Pica	Programador	jaime.diezpica@alum.uca.es
Pablo Moulet Fernandez	Programador	pablo.moufer@alum.uca.es
Carlos Camacho Martín	Programador	carlos.camachomartin@alum.uca.es
Ángela Escribano Marcos	Programador	an.escribanomarcos@alum.uca.es
Laura María Via Alba	Programador	laura.viaalba@alum.uca.es
Nadia Kerre	Tester	mail@uca.es
Lucía Zúñiga Sánchez	Tester	lucia.zunisan@alum.uca.es

3. Planificación temporal

3.1. Hitos y entregas del proyecto

N.º	Entrega	Se da por buena si...	Fecha	Estado
1	Análisis de requisitos y planificación	Recoge todos los requisitos imprescindibles, las dudas resueltas y un calendario.	13/11/2026	En curso
2	Maquetas	Incluyen lista, mapa, ficha, aviso y ajustes, con la imagen del ROA.	Semana 6	En curso
3	Versión intermedia	La lista y la ficha funcionan con el entorno de pruebas.	Semana 8	Pendiente
4	Versión final	Cumple todo lo imprescindible y supera la prueba final del pliego.	Semana 12	Pendiente
5	Código y documentación	Repositorio con instrucciones de compilación e instalación, manual de usuario y manual técnico.	Semana 12	Pendiente

3.2. Diagrama de Gantt

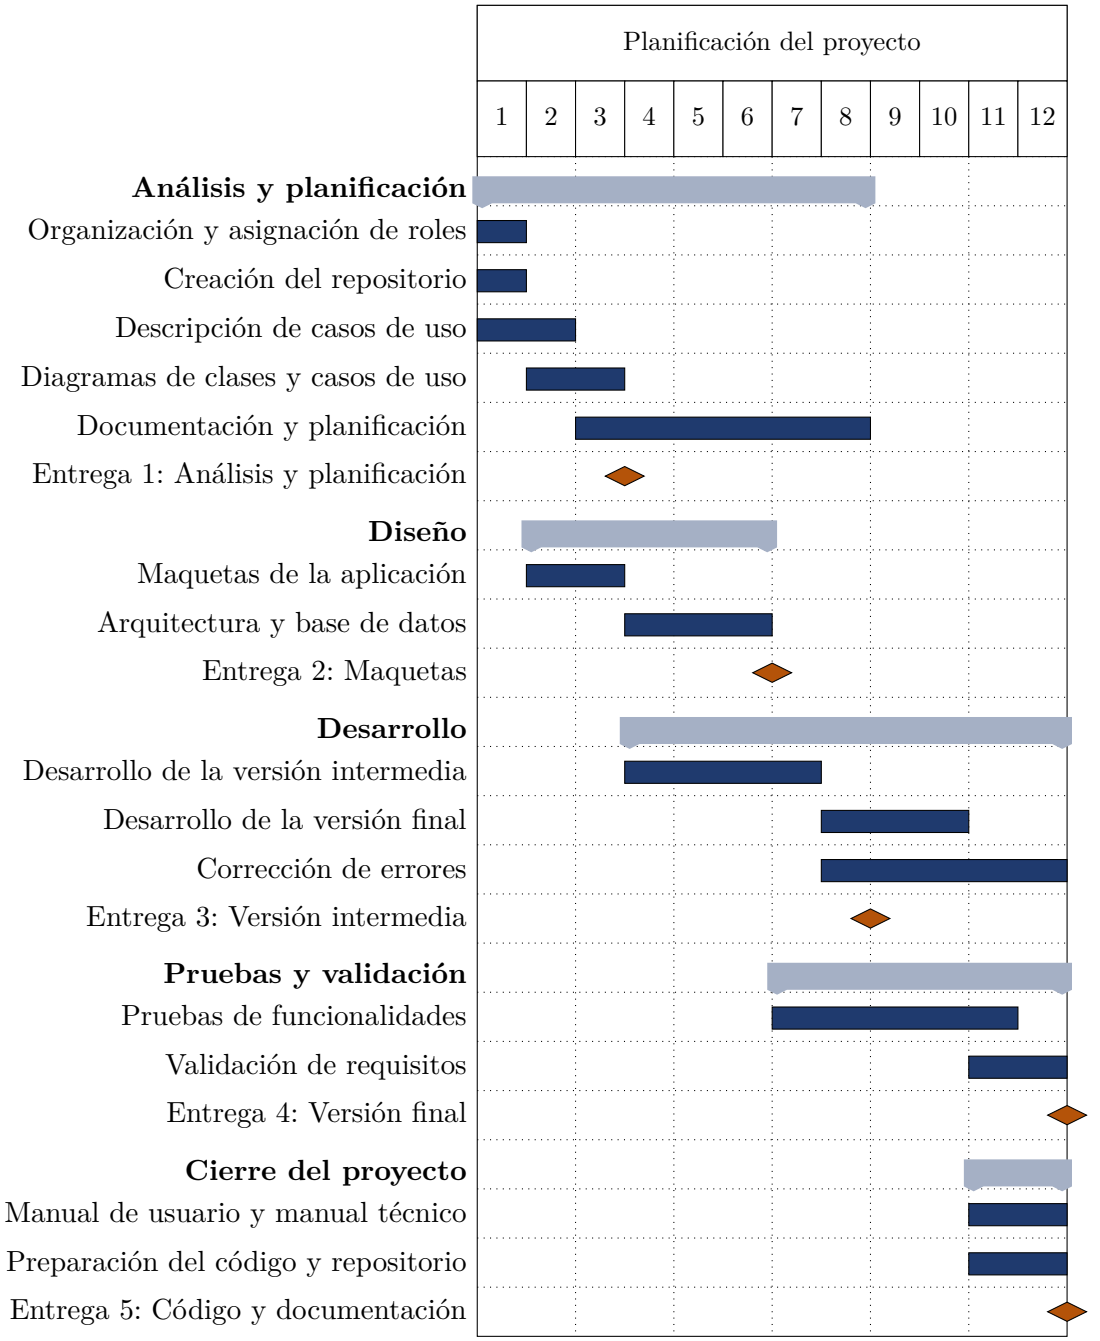

4. Asignación de responsabilidades

4.1. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidades	Entregas
Jefe de proyecto	Dirigir al equipo, plantear la arquitectura provisional del sistema, repartir las tareas semanales y comunicarse con el cliente.	Reparto de tareas y decisiones de diseño del sistema.
Analistas	Elaborar esquemas de análisis, preparar preguntas para el cliente, realizar la planificación (Gantt) y redactar la documentación en LaTeX.	Diagrama de clases, diagrama de casos de uso, descripción de casos de uso, Gantt y documentación.
Diseñadores	Elaborar las maquetas de los menús y elementos de la aplicación, los diagramas de clases del proyecto, el diseño de la base de datos y la clase que contiene los datos del terremoto (JSON).	Maquetas, diagramas de clases de diseño y modelo de base de datos.
Programadores A (*frontend*)	Implementar la interfaz de usuario de la aplicación, incluyendo el listado de terremotos, la visualización de la información del ROA y la pantalla de ajustes para seleccionar entre hora local y UTC.	Interfaz de usuario implementada y funcional.
Programadores B (*backend*)	Implementar la lógica del servidor para recibir los datos de los terremotos en formato JSON, gestionar las notificaciones a los topics correspondientes, almacenar la información en la base de datos y recuperar registros según una fecha determinada.	Servicios de gestión de terremotos, notificaciones y acceso a la base de datos.
Testers	Probar las funcionalidades desarrolladas por los programadores y notificar los errores detectados.	Informes de errores y revisiones. Revisar el trabajo de analistas y diseñadores

4.2. Reparto de tareas por semana

Semana	Rol	Tarea	Estado
1	Todos	Asignación de roles.	Terminada
1	Todos	Creación del repositorio de trabajo.	Terminada
1	Jefe de proyecto y Analistas	Primera reunión con el cliente.	Terminada
2	Todos	Descargar y probar la aplicación de terremotos del IGN.	Terminada
2	Analistas	Completar los esquemas con las funcionalidades.	Terminada
2	Diseñadores	Elaboración de las maquetas de los distintos menús y sus elementos.	Pendiente
2	Programadores	Decidir la plataforma y el lenguaje de programación y familiarizarse con ellos.	Terminada
2	Programadores	Estudiar cómo implementar el envío de notificaciones y comunicar la propuesta al cliente.	Terminada
2	Testers	Apoyar al resto de los integrantes del equipo, dado que todavía no había funcionalidades que probar.	Terminada
2	Todos	Proponer un nombre para la aplicación.	Pendiente de opinión
3	Analistas	Finalizar la lista de preguntas para la próxima reunión con el cliente.	Terminada
3	Analistas	Comenzar la elaboración de la documentación en LaTeX.	En curso
3	Diseñadores	Elaborar los diagramas de las clases principales.	En curso
3	Diseñadores	Diseñar una propuesta provisional de la base de datos.	En curso
3	Diseñadores	Definir la clase provisional que contendrá los datos del terremoto en formato JSON.	En curso
3	Programadores A	Desarrollar la lista deslizable de terremotos, el panel de información del ROA y el ajuste de hora local/UTC.	En curso
3	Programadores B	Implementar las notificaciones mediante FCM, el almacenamiento de datos y las funciones de consulta por fecha.	En curso

Continúa en la página siguiente

Semana	Rol	Tarea	Estado
3	Testers	Revisar el trabajo de analistas y diseñadores y realizar pruebas sobre el código desarrollado.	En curso

5. Seguimiento del proyecto

5.1. Registro de hitos

Fecha	Hito	Descripción	Responsable
21/10/2026	Creación del repositorio Git	Repositorio del equipo creado en GitHub. Configuración inicial en la documentación de desarrollo.	Jaime Díez Pica
23/10/2026	Primera reunión con el cliente	Reunión de presentación del pliego de requisitos. Acta en la documentación de requisitos.	Jefe y Analistas
04/11/2026	Descripción de casos de uso	Primera versión completada.	Analistas
05/11/2026	Diagrama de clases	Primera versión completada.	Analistas
05/11/2026	Diagrama de casos de uso	Primera versión completada.	Analistas
11/11/2026	Diagrama de Gantt	En elaboración.	Analistas

Tabla 3: Registro cronológico de hitos del proyecto

5.2. Seguimiento periódico

Se propone mantener la siguiente tabla actualizada al final de cada semana.

Semana	Completado	Incidencias / riesgos
1	Creación de repositorio, asignación de roles, reunión con el cliente	Sin incidencias
2	Esquemas casos de uso, planteamiento de notificaciones, estudio de la app del IGN y elección de tecnología.	Retraso con la entrega del diseño de menús y sus elementos
3	En curso	Sin incidencias
